



PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
& DỰ ÁN
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DỰ ÁN MỚI

Số hiệu: **QTKHCN-19**

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 01/9/2013

1. MỤC ĐÍCH

Tăng cường và bổ sung trang thiết bị nhằm tạo nên một hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, đồng bộ đáp ứng các nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển chung của Trường.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Phòng Khoa học Công nghệ & Dự án, các Khoa trực thuộc Trường và các đơn vị khác có liên quan đến quá trình đăng ký các dự án mới.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009.
- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật Xây dựng.
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 12/2009/NĐ-CP.
- Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 25/9/2007 của Đại học Quốc gia về việc quy định về việc xét duyệt và triển khai dự án đầu tư phòng thí nghiệm tại ĐHQG-HCM.

4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT

4.1. Định nghĩa:

- 4.1.1. Hội đồng xét chọn cơ sở:** do Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa thành lập để đánh giá tính khoa học, tính khả thi của dự án và lập danh mục các dự án theo thứ tự ưu tiên. Thành phần gồm: Ban Giám hiệu, các Phòng, Ban chức năng, Ban chủ nhiệm các khoa,...
- 4.1.2. Hội đồng sơ tuyển:** Do Giám đốc ĐHQG thành lập trên cơ sở các Ban chủ nhiệm các chương trình KHCN trọng điểm của ĐHQG-HCM. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá tính cần thiết, tính khả thi của dự án và sắp xếp danh mục dự án theo thứ tự ưu tiên, có ý kiến tư vấn cho Giám đốc ĐHQG-HCM xem xét, quyết định đầu tư.
- 4.1.3. Hội đồng thẩm định:** Do Giám đốc ĐHQG thành lập có nhiệm vụ: thẩm định, có ý kiến về mục tiêu, nội dung đầu tư, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và thực hiện dự án, trình độ và cơ cấu các thiết bị, có kết luận tư vấn cho ĐHQG-HCM phê duyệt dự án.

4.2. Chữ viết tắt:

ĐHQG - HCM: Đại học Quốc Gia Tp.HCM.

B. KHCN: Ban Khoa học & Công nghệ - Đại học Quốc Gia Tp.HCM.

ĐHBK: Đại học Bách Khoa.

P.KHCN&DA: Phòng Khoa học công nghệ và Dự án.

CNDA: chủ nhiệm dự án.

BGH: Ban giám hiệu.

Khoa: Các Khoa trực thuộc Trường Đại học Bách khoa.

PTN: Phòng thí nghiệm.








HĐCS: Hội đồng cơ sở.


HĐST: Hội đồng sơ tuyển.


HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.

5. NỘI DUNG

5.1. Lưu đồ quy trình đấu thầu

STT	LƯU ĐỒ	TRÁCH NHIỆM
5.1.1		B.KHCN
5.1.2		P.KHCN&DA
5.1.3		CNDA, Khoa
5.1.4		P.KHCN&DA
5.1.5		BGH, P.KHCN&DA
5.1.6		HĐCS
5.1.7		P.KHCN&DA

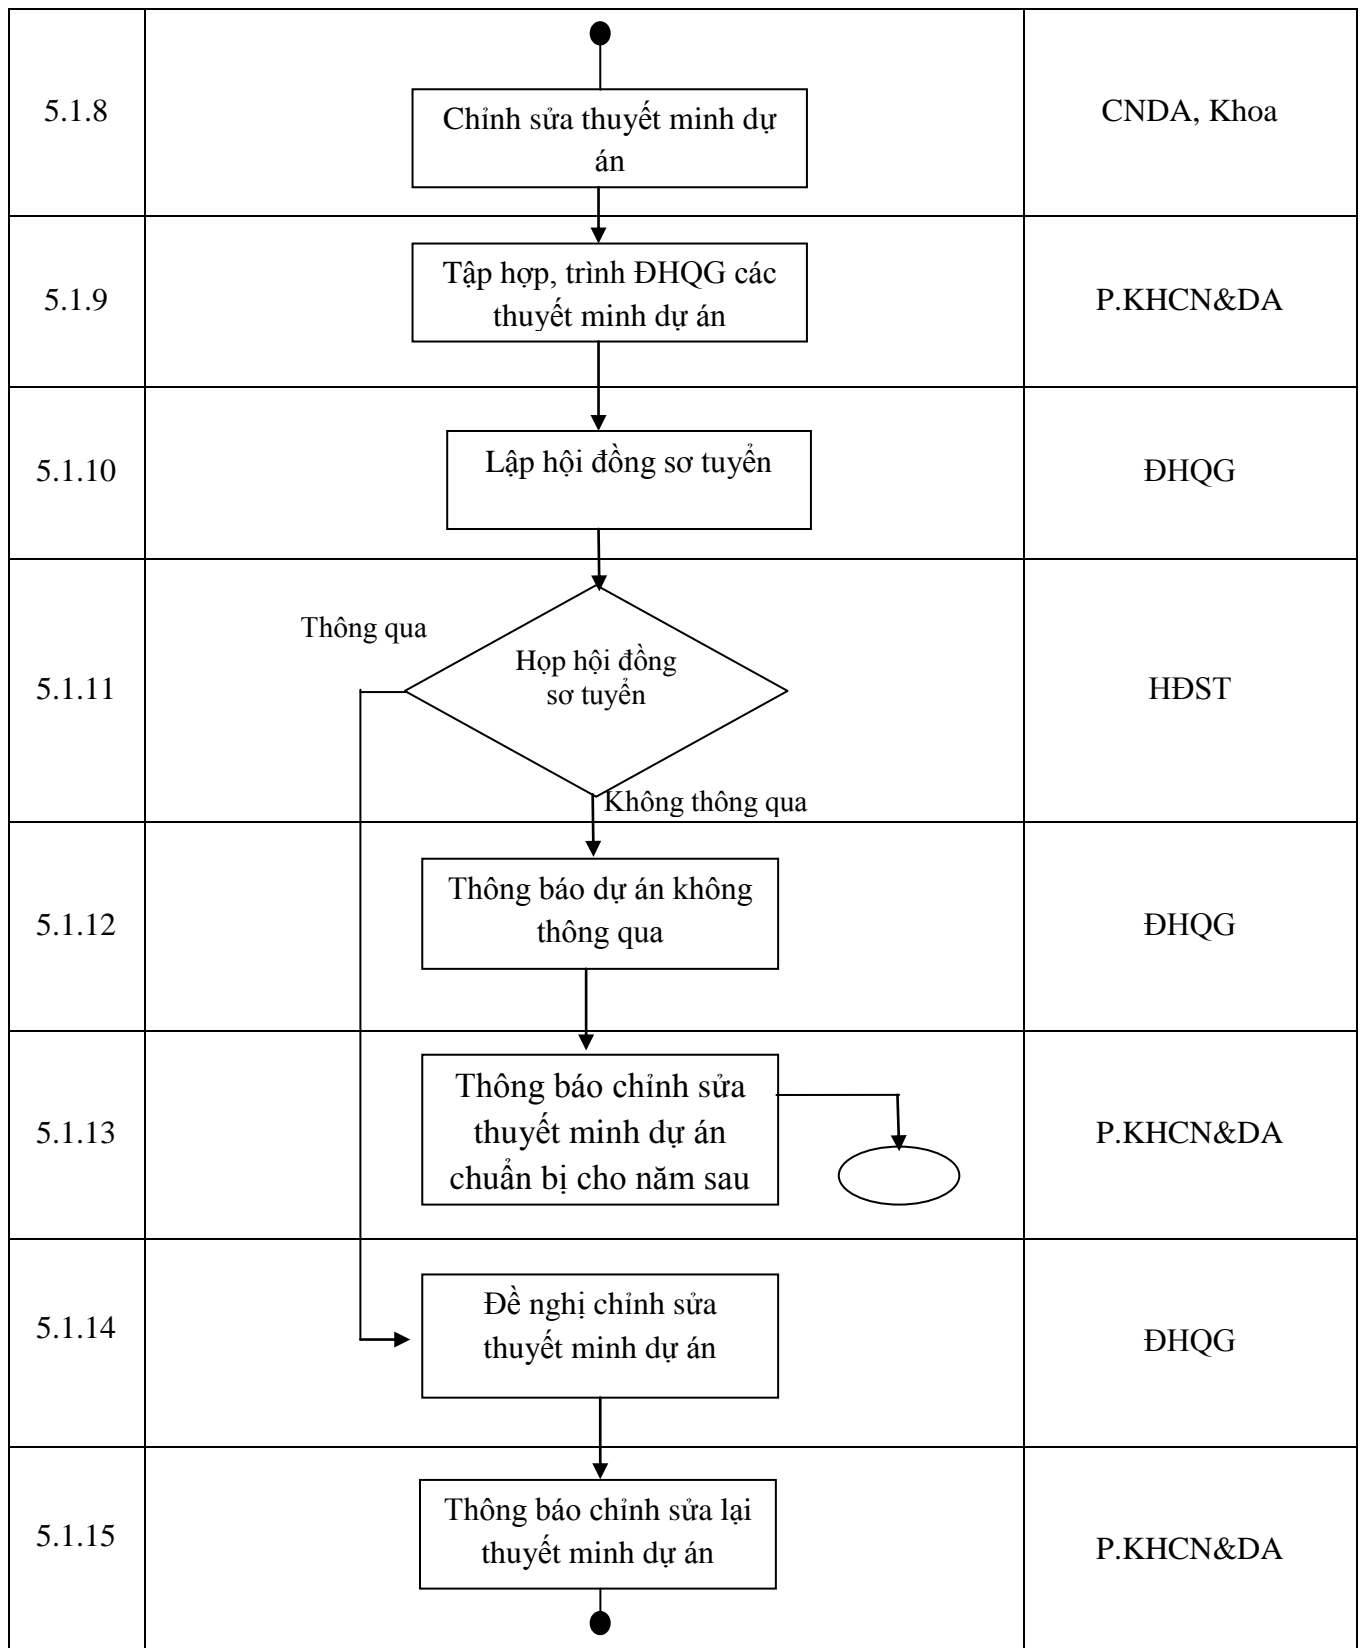

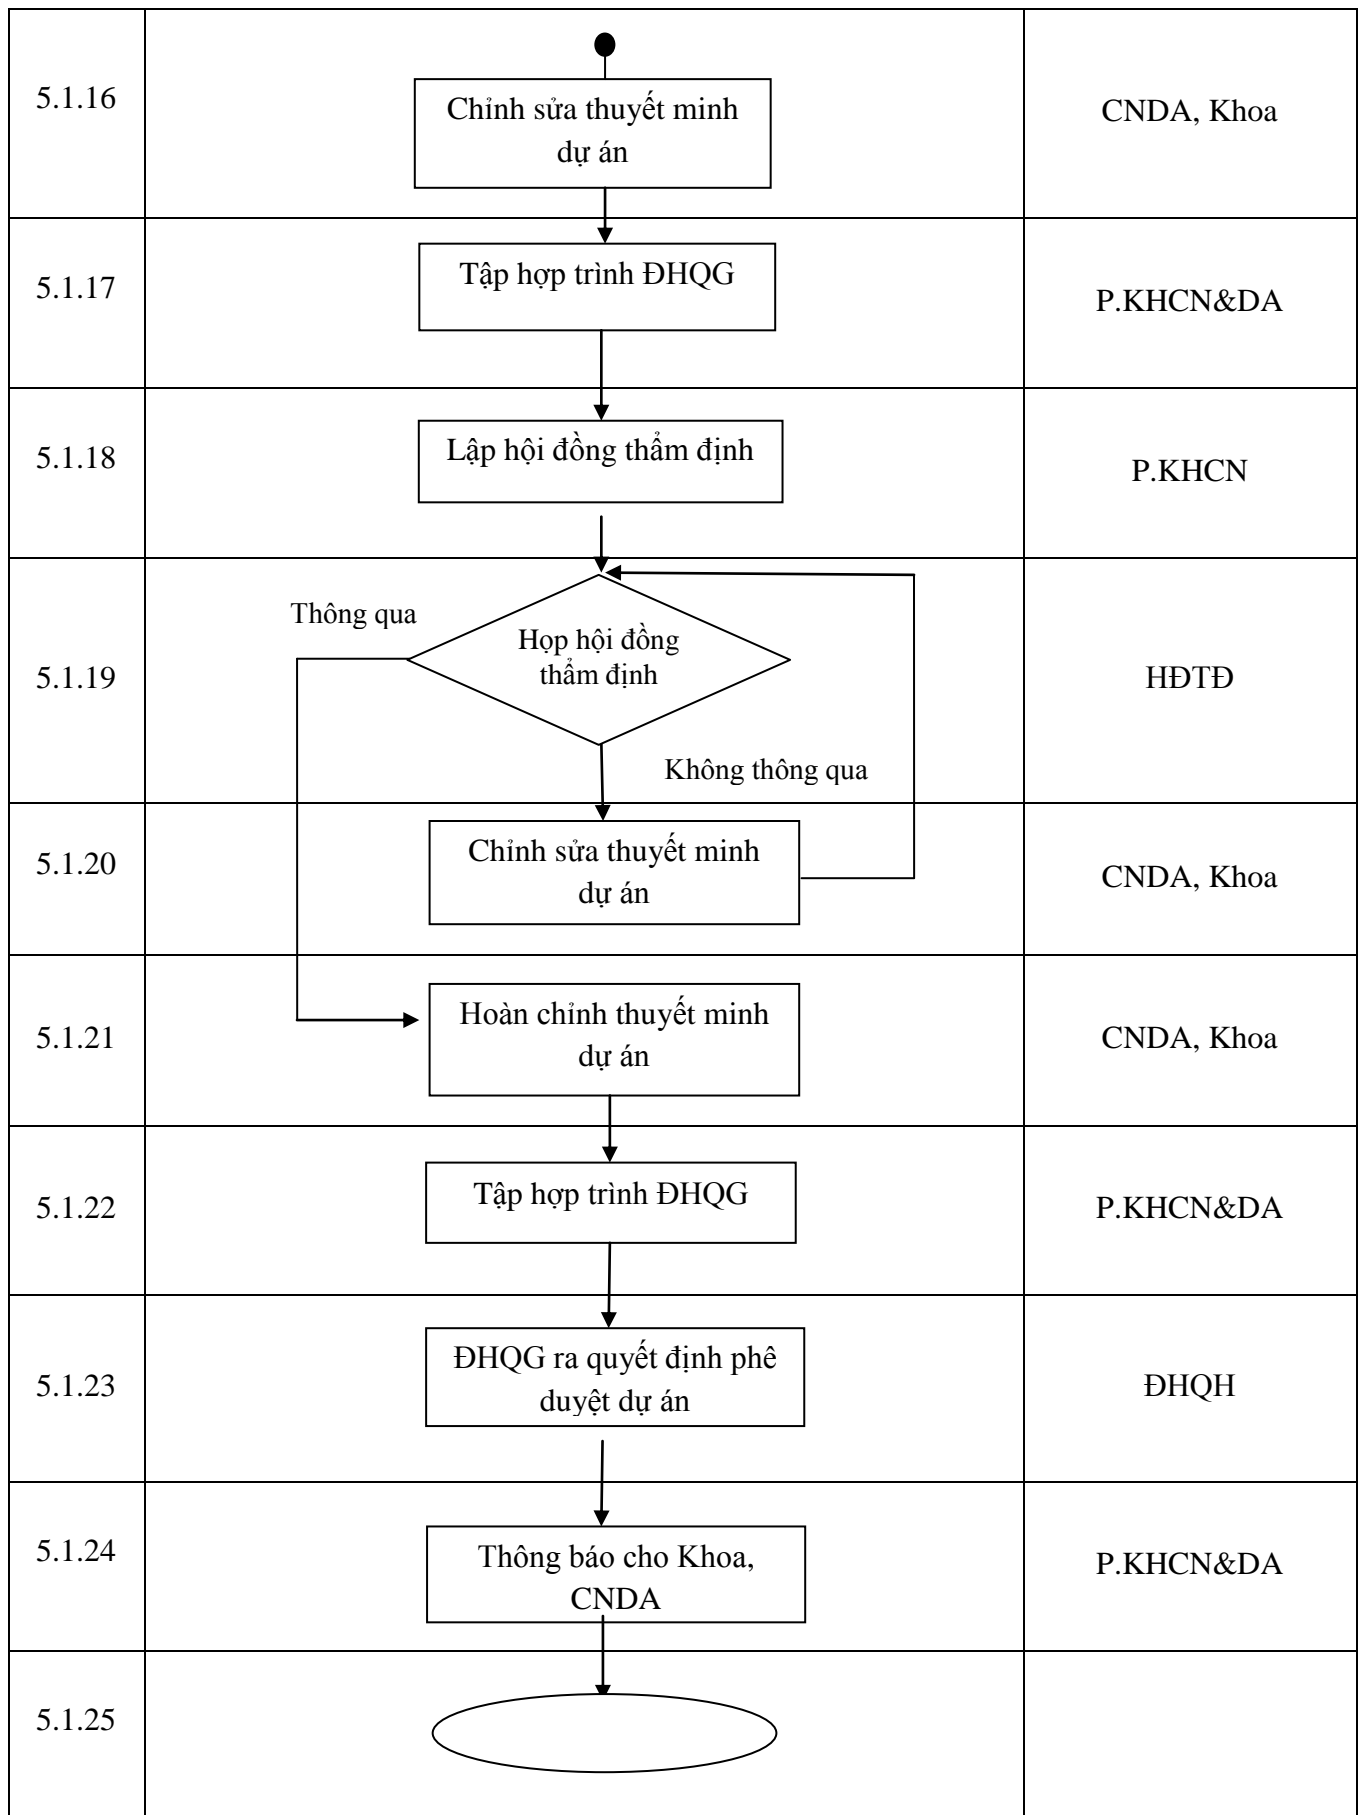

5.2. Mô tả

TT	CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	TRÁCH NHIỆM		CHUẨN CHẤP NHẬN	BIỂU MẪU/TÀI LIỆU	THỜI GIAN
			CHÍNH	HỖ TRỢ			
1	5.1.1 Thông báo lập kế hoạch các dự án đầu tư PTN	- Đầu năm ĐHQG có thông báo lập kế hoạch các dự án đầu tư PTN.	B.KHCN				
2	5.1.2 Thông báo kế hoạch và đề nghị các Khoa lập thuyết minh dự án	- Phòng KHCN&DA thông báo kế hoạch và đề nghị các Khoa có nhu cầu lập dự án	P.KHCN&DA			BM01/KHCN-19	
3	5.1.3 Lập thuyết minh dự án	- Các Khoa triển căn cứ theo hướng nghiên cứu của ĐHQG, căn cứ chiến lược phát triển của Trường, chiến lược phát triển của đơn vị lập thuyết minh các dự án và gửi Phòng Khoa học Công nghệ & Dự án	CNDA, Khoa		Thuyết minh đầy đủ, rõ ràng, đúng mẫu qui định	BM02/KHCN-19	
4	5.1.4 Tổng hợp các dự án	- Dựa trên đề xuất của các Khoa, Phòng Khoa học Công nghệ & Dự án tổng hợp các dự án.	P.KHCN&DA				
5	5.1.5 Lập hội đồng cơ sở	- P.KHCN&DA tiến hành lập hội đồng cơ sở trình BGH ra quyết định	BGH, P.KHCN&DA			BM03/KHCN-19	

6	5.1.6 Hội đồng cơ sở	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng đánh giá tính khoa học, tính khả thi của dự án. - Dự án nào không phù hợp sẽ loại bỏ. - Dự án phù hợp sẽ được hội đồng sắp theo thứ tự ưu tiên. 	P.KHCN&DA		Theo đúng nhiệm vụ quy định trong quyết định thành lập hội đồng cơ sở	BM04/KHCN-19	
7	5.1.7 Thông báo chỉnh sửa thuyết minh dự án	<ul style="list-style-type: none"> - Trên cơ sở ý kiến của hội đồng, P. KHCN&DA thông báo đề nghị CNDA, Khoa chỉnh sửa lại thuyết minh của dự án theo ý kiến đóng góp của HĐCS. 	P.KHCN&DA			BM05/KHCN-19	
8	5.1.8 Chỉnh sửa thuyết minh dự án	<ul style="list-style-type: none"> - CNDA, Khoa chỉnh sửa lại thuyết minh dự án theo ý kiến đóng góp. 	CNDA, Khoa		Theo đúng ý kiến đóng góp của hội đồng cơ sở	BM03/KHCN-19	
9	5.1.9 Tập hợp, trình ĐHQG các thuyết minh dự án	<ul style="list-style-type: none"> - Tập hợp các thuyết minh dự án, trình ĐHQG xem xét. 	P.KHCN&DA			BM06/KHCN-19	
10	5.1.10 Lập hội đồng sơ tuyển	<ul style="list-style-type: none"> - ĐHQG lập hội đồng sơ tuyển để tuyển chọn các dự án. 	ĐHQG				
11	5.1.11 Hội đồng sơ tuyển	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng tiến hành đánh giá tính cần thiết, tính khả thi của dự án và sắp xếp danh mục dự án theo thứ tự ưu tiên, có ý kiến tư vấn cho Giám đốc ĐHQG-HCM xem xét, quyết định 	HĐST				

		đầu tư. - Nêu không thông qua thì qua bước 5.1.12. - Nếu thông qua thì qua bước 5.1.14					
12	5.1.12 Thông báo dự án không thông qua	- ĐHQG thông báo dự án không thông qua	ĐHQG				
13	5.1.13 Thông báo chỉnh sửa thuyết minh dự án chuẩn bị cho năm sau	- P. KHCN&DA thông báo kết quả sơ tuyển và đề nghị chỉnh sửa thuyết minh dự án chuẩn bị cho các năm sau.	P.KHCN&DA			BM07/KHCN-19	
14	5.1.14 Đề nghị chỉnh sửa thuyết minh dự án	- ĐHQG thông báo và đề nghị chỉnh sửa thuyết minh dự án	ĐHQG				
15	5.1.15 Thông báo chỉnh sửa lại thuyết minh dự án	- P. KHCN&DA thông báo kết quả sơ tuyển và đề nghị chỉnh sửa thuyết minh dự án theo ý kiến đóng góp của hội đồng sơ tuyển.	P.KHCN&DA			BM08/KHCN-19	
16	5.1.16 Chỉnh sửa thuyết minh dự án	- CNDA, Khoa chỉnh sửa lại thuyết minh dự án theo ý kiến đóng góp của hội đồng sơ tuyển.	CNDA, Khoa		Theo đúng ý kiến đóng góp của hội đồng sơ tuyển	BM03/KHCN-19	
17	5.1.17 Tập hợp trình ĐHQG	- P.KHCN&DA tập hợp lại các thuyết minh đã chỉnh sửa trình ĐHQG xem xét	P.KHCN&DA			BM09/KHCN-19	

18	5.1.18 Lập hội đồng thẩm định	- Đại học quốc gia lập hội đồng thẩm định dự án.	ĐHQG				
19	5.1.19 Họp hội đồng thẩm định	- Hội đồng tiến hành thẩm định, có ý kiến về mục tiêu, nội dung đầu tư, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và thực hiện dự án, trình độ và cơ cấu các thiết bị. - Nếu không thông qua thì qua bước 5.1.20. - Nếu thông qua thì qua bước 5.1.21.	HĐTĐ				
20	5.1.20 Chỉnh sửa thuyết minh dự án	- Đối với các dự án không thông qua, CNDA phải hoàn chỉnh thuyết minh, bảo vệ lại trước hội đồng và phải được hội đồng thông qua trong khoảng 30 ngày sau ngày họp thẩm định trước đó. Quá thời hạn trên dự án sẽ bị loại khỏi danh mục dự án dự kiến đầu tư	CNDA, Khoa		Theo đúng ý kiến đóng góp của hội đồng thẩm định	BM03/KHCN- 19	
21	5.1.21 Hoàn chỉnh thuyết minh dự án	- CNDA, Khoa hoàn chỉnh thuyết minh dự án trên cơ sở ý kiến của hội đồng thẩm định. Trong khoảng 15 ngày sau ngày họp hội đồng thẩm định	CNDA, Khoa		Theo đúng ý kiến đóng góp của hội đồng thẩm định	BM03/KHCN- 19	
22	5.1.22 Tập hợp trình ĐHQG	- P. KHCN&DA tập hợp trình ĐHQG xem xét.	P.KHCN&DA			BM10/KHCN- 19	

23	5.1.23 ĐHQG ra quyết định phê duyệt dự án	- ĐHQG ra quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt tổng dự toán.	ĐHQG				
24	5.1.24 Thông báo cho Khoa, CNDA	- Phòng KHCN&DA lưu quyết định. - Thông báo cho CNDA, Khoa	P.KHCN&DA			BM11/KHCN-19	
25	5.1.25 Kết thúc quy trình	- Kết thúc quy trình					

6. HỒ SƠ LƯU

Stt	Tên hồ sơ	Loại hồ sơ	Đơn vị ban hành	Đơn vị nhận
1	Thông báo lập kế hoạch các dự án đầu tư PTN	Thông báo	ĐHQG	ĐHBK
2	Thông báo kế hoạch và đề nghị các Khoa có nhu cầu lập dự án	Thông báo	P.KHCN&DA	Khoa
3	Thuyết minh dự án	Thuyết minh	Khoa	P.KHCN&DA
4	Danh sách các dự án đơn vị gửi lên	Danh sách	P.KHCN&DA	HĐCS
5	Quyết định thành lập hội đồng cơ sở	Quyết định	BGH	P.KHCN&DA, HĐST
6	Các biên bản họp hội đồng cơ sở	Biên bản	HĐCS	P.KHCN&DA
7	Thông báo đề nghị CNDA, Khoa chỉnh sửa lại thuyết minh của dự án theo ý kiến đóng góp của HĐCS	Thông báo	P.KHCN&DA	Khoa, CNDA
8	Công văn trình ĐHQG thuyết minh các dự án	Công văn	ĐHBK	ĐHQG
9	Thông báo kết quả sơ tuyển của ĐHQG	Thông báo	ĐHQG	ĐHBK
10	Thông báo kết quả sơ tuyển và đề nghị chỉnh sửa thuyết minh dự án theo ý kiến đóng góp của hội đồng sơ tuyển	Thông báo	P.KHCN&DA	Khoa, CNDA
11	Công văn trình ĐHQG các thuyết minh dự án đã chỉnh sửa theo ý kiến HĐST	Công văn	ĐHBK	ĐHQG
12	Công văn trình ĐHQG các thuyết minh dự án đã chỉnh sửa theo ý kiến HĐTĐ	Công văn	ĐHBK	ĐHQG
13	Quyết định phê duyệt dự án	Quyết định	ĐHQG	ĐHBK
14	Quyết định phê duyệt tổng dự toán	Quyết định	ĐHQG	ĐHBK
15	Thông báo kết quả phê duyệt dự án	Thông báo	P.KHCN&DA	Khoa, CNDA

7. BIỂU MẪU – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

7.1. Biểu mẫu

STT	Mã hiệu	Tên biểu mẫu
1	BM01/KHCN-19	Thông báo kế hoạch và đề nghị các Khoa có nhu cầu lập dự án
2	BM02/KHCN-19	Mẫu thuyết minh dự án
3	BM03/KHCN-19	Quyết định thành lập hội đồng cơ sở
4	BM04/KHCN-19	Biên bản họp hội đồng
5	BM05/KHCN-19	Thông báo đề nghị CNDA, Khoa chỉnh sửa lại thuyết minh của dự án theo ý kiến đóng góp của HĐCS
6	BM06/KHCN-19	Công văn trình ĐHQG các thuyết minh dự án
7	BM07/KHCN-19	Thông báo kết quả sơ tuyển và đề nghị chỉnh sửa thuyết minh dự án chuẩn bị cho các năm sau
8	BM08/KHCN-19	Thông báo kết quả sơ tuyển và đề nghị chỉnh sửa thuyết minh dự án theo ý kiến đóng góp của hội đồng sơ tuyển
9	BM09/KHCN-19	Công văn trình ĐHQG các thuyết minh dự án đã chỉnh sửa theo ý kiến HĐST
10	BM10/KHCN-19	Công văn trình ĐHQG các thuyết minh dự án đã chỉnh sửa theo ý kiến HĐTĐ
11	BM11/KHCN-19	Thông báo kết quả phê duyệt dự án

7.2. Phụ lục

Không có

Quy trình có hiệu lực kể từ:

Người soạn

Người duyệt

Nguyễn Duy Thanh

Ngô Thanh An
